


Třinecké Železářny
Sekundární odprášení KKO


Harmonogram výstavby

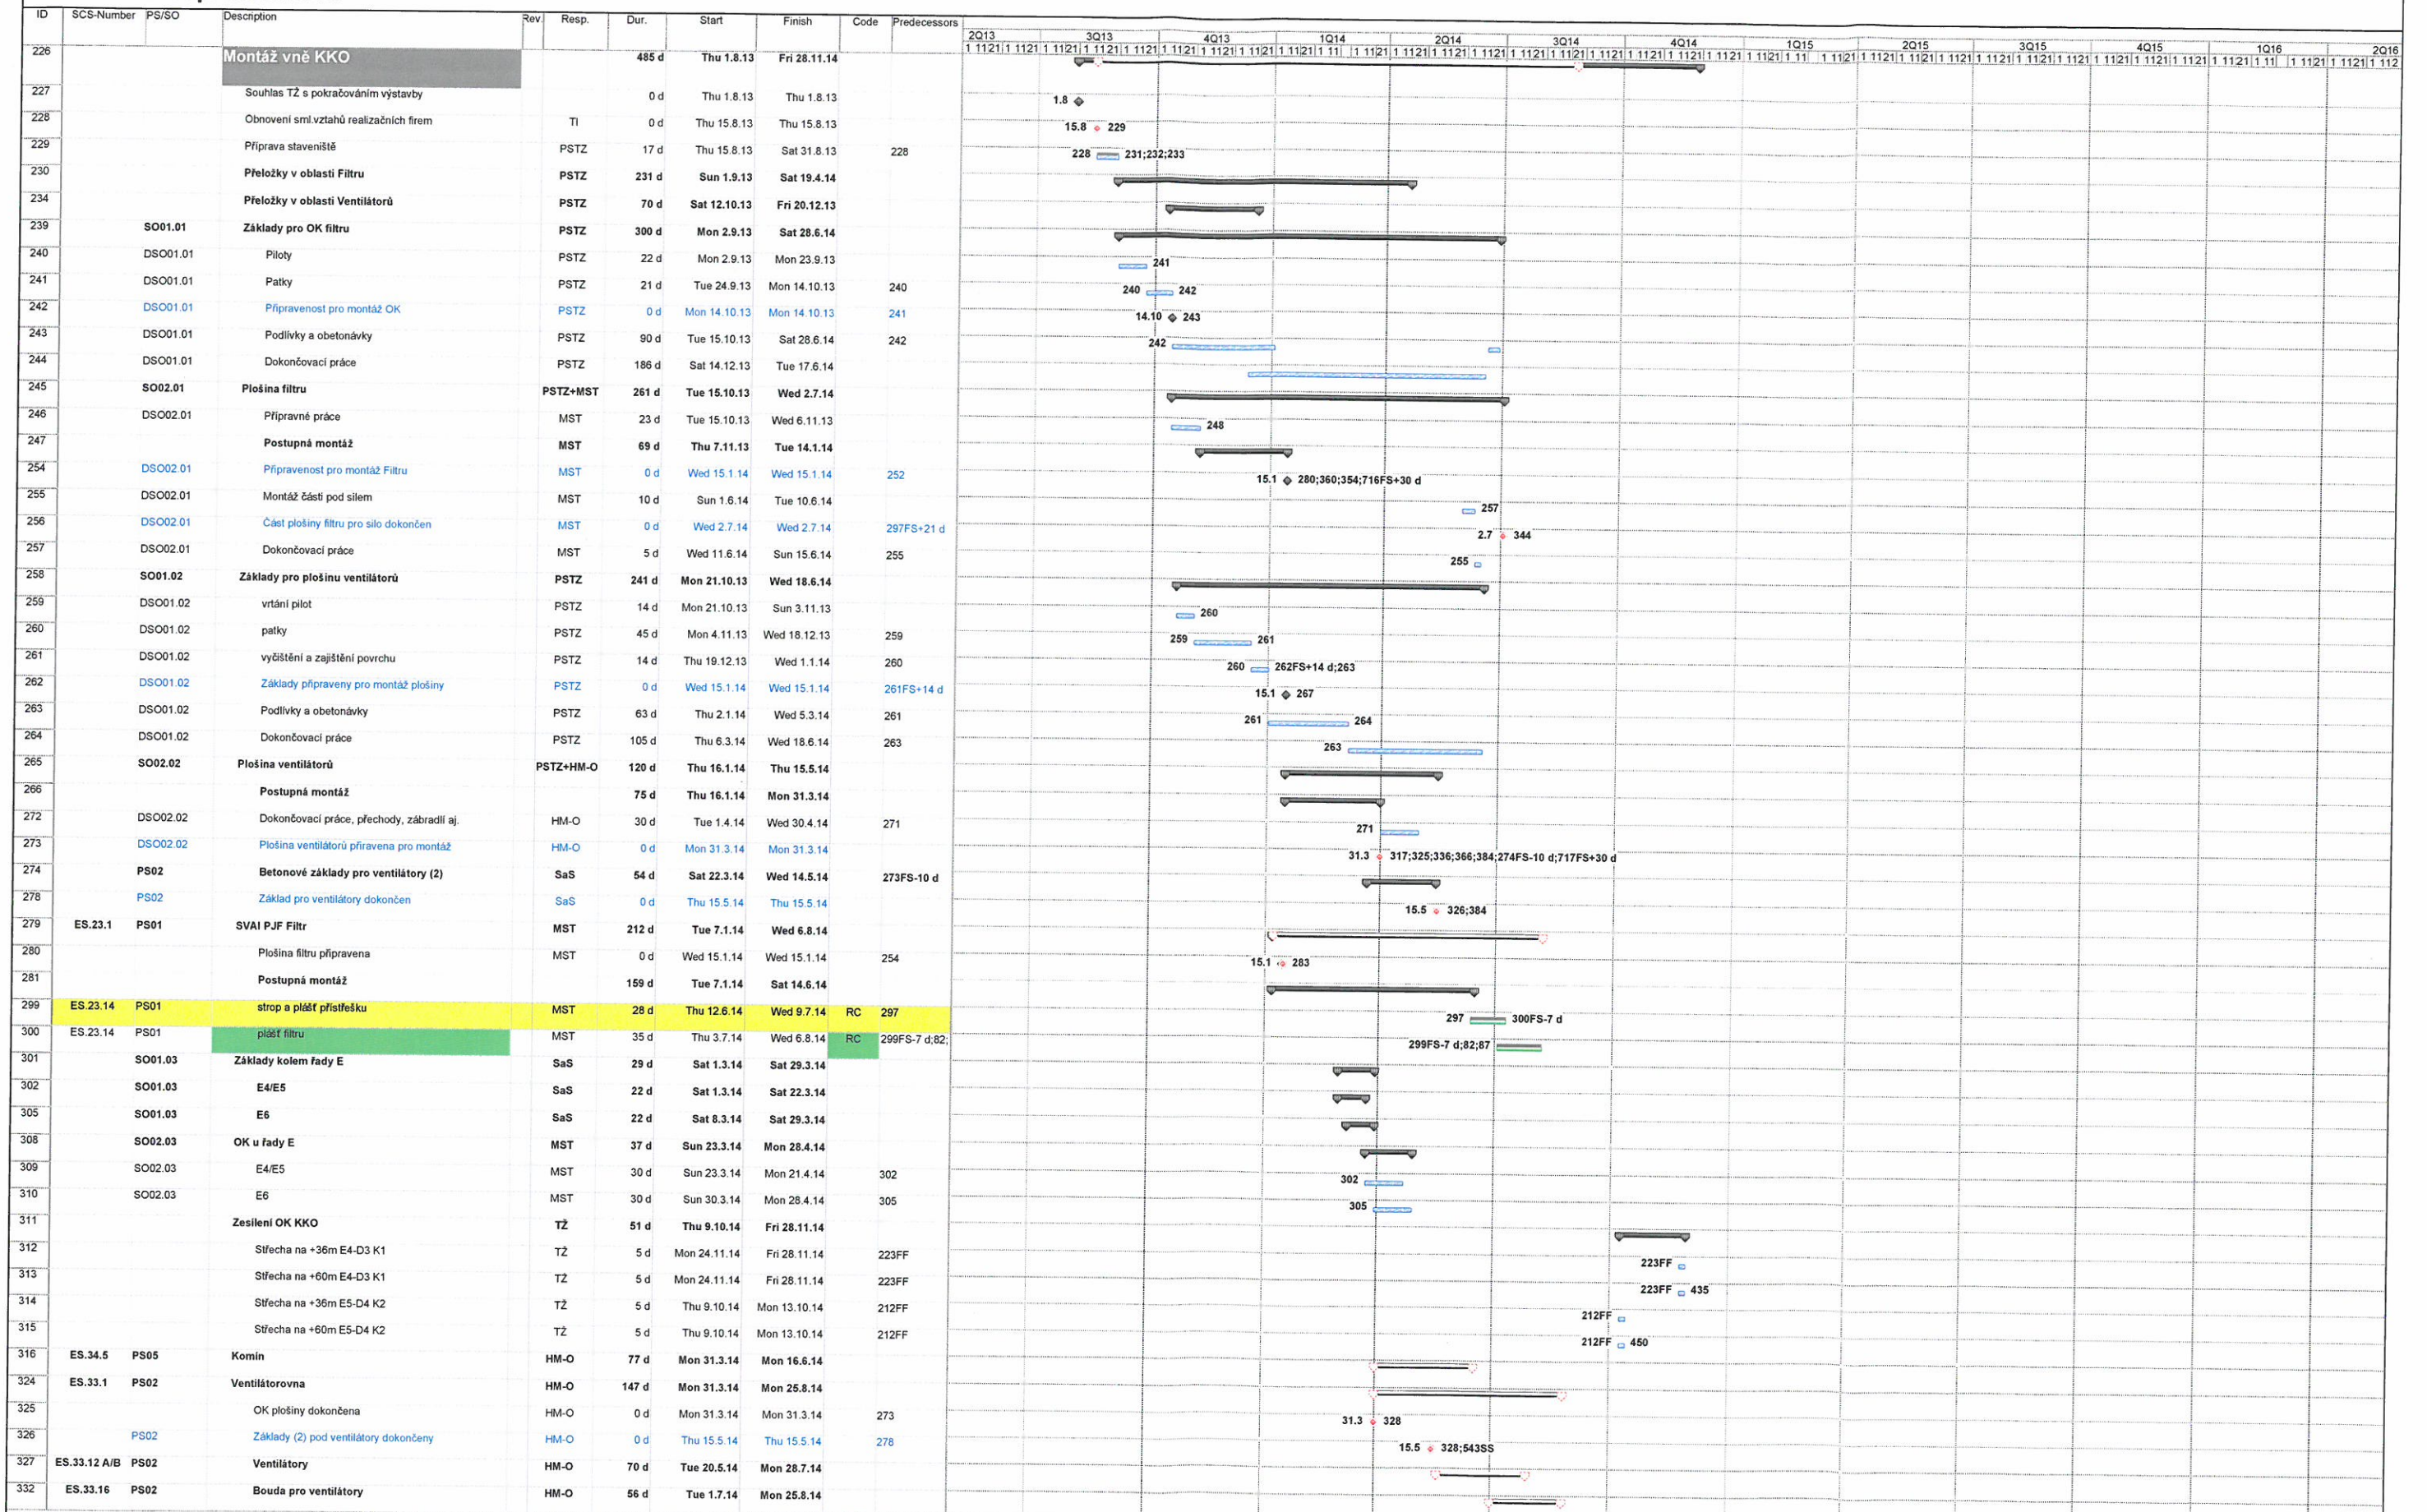

h

Třinecké Železářny
Sekundární odprášení KKO

Harmonogram výstavby

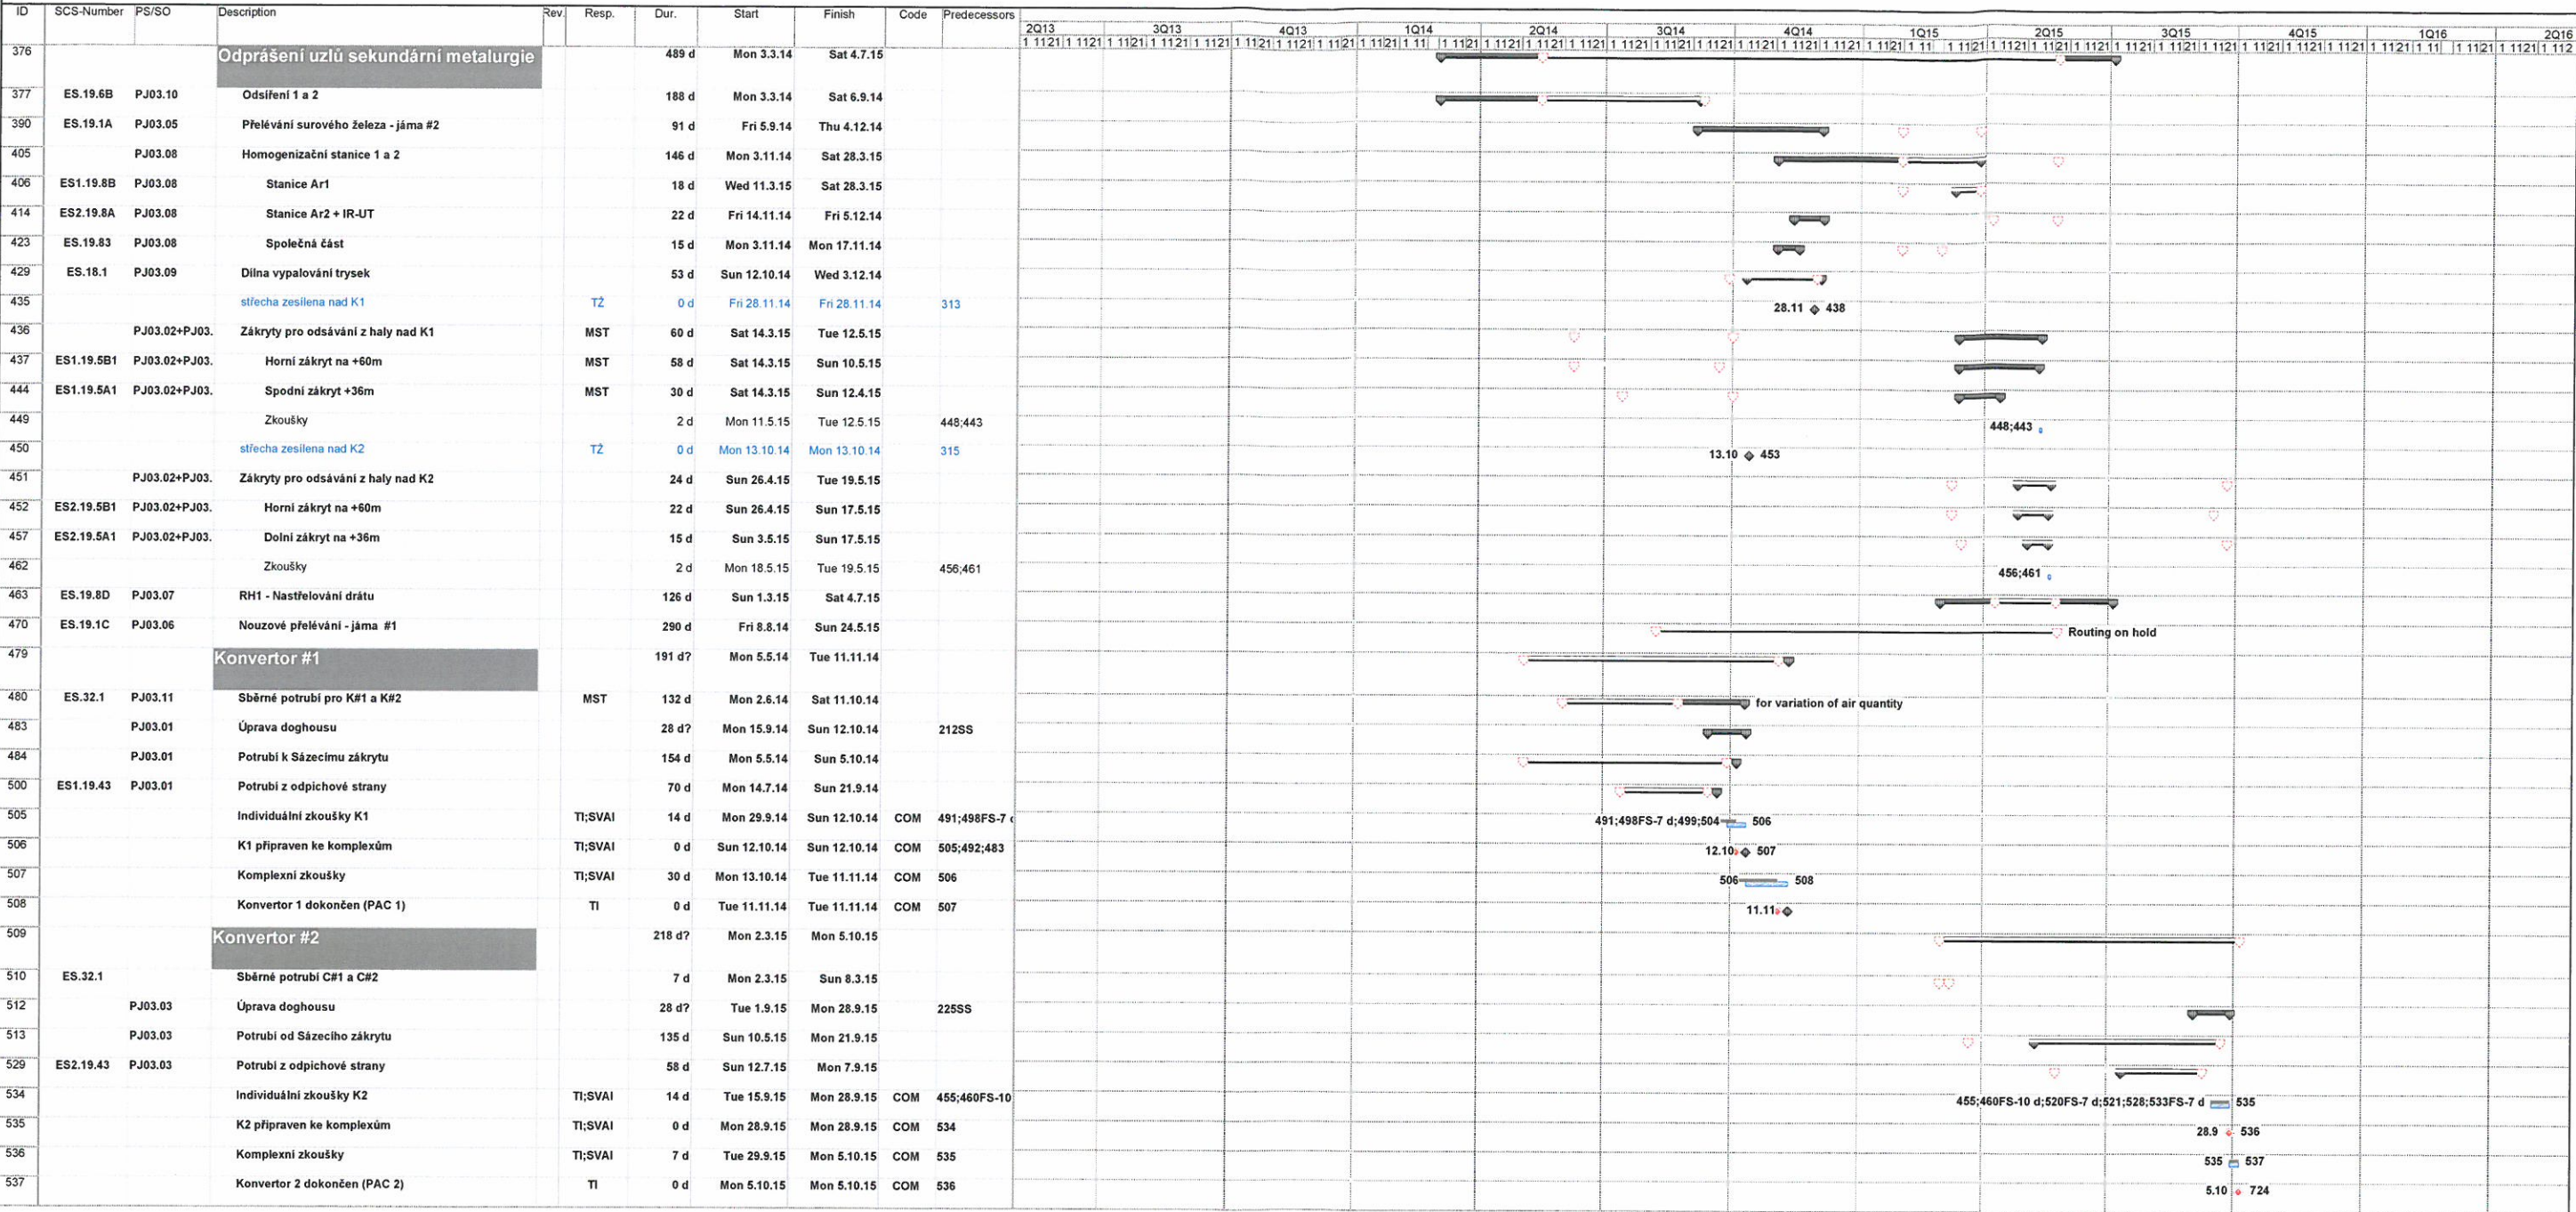

Třinecké Železářny

Sekundární odprášení KKO

Harmonogram výstavby

ID	SCS-Number	PS/SO	Description	Rev.	Resp.	Dur.	Start	Finish	Code	Predecessors	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	
722			Dokončovací práce			224 d	Tue 29.9.15	Mon 9.5.16			1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121	1 1121
723			Komplexní zkoušky dokončeny		TI	14 d	Mon 5.10.15	Mon 19.10.15																
726			Uvedení do zkušebního provozu			43 d	Tue 29.9.15	Tue 10.11.15																
727			Žádost o stanovení místního šetření		TI	21 d	Tue 29.9.15	Mon 19.10.15	728SS-21 d												728SS-21 d			
728			Předběžné šetření s hygienou, hasiči aj.		TI	7 d	Tue 20.10.15	Mon 26.10.15	725												725	729;727SS-21 d		
729			Místní šetření		TI	1 d	Tue 27.10.15	Tue 27.10.15	728												728	730		
730			Nabytí právní moci Zkušebního provozu		TI	14 d	Wed 28.10.15	Tue 10.11.15	729												729	731		
731			Povolení ke ZP je platné - Poslední fakturace		TI	0 d	Tue 10.11.15	Tue 10.11.15	730												10.11			

C.PI60 - TRINEC DED

IST

Fortschritt

SOLL

IST-Milestone

SOLL-Milestone

IST-Summenbalken

SOLL-Summenbalken

SVAI2014-03-27 pracovní verze - pro DvD6.mpp

2014-03-05, Čepce podle hmg. SVAI Rev. 3, W. Glück

7 z 8

R
