Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 404/KSÚS/2014
Číslo smlouvy zhotovitele: D4/71/2014

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :	00066001
DIČ:	CZ00066001
Jednající:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**")
na straně jedné

a

Metrostav, a.s.

se sídlem:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ:	00014915
DIČ:	CZ00014915
zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Jednající:	Ing. František Kočí, člen představenstva Ing. Ján Dudáš, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. František Kočí, člen představenstva Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**")
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též **„Smluvní strany"** a jednotlivě jako „**Smluvní strana**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2014 „Smlouvu o provedení stavby" (dále jen „**Smlouva**") na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1185, most ev.č. 1185-5 - Most přes potok v obci Obecnice**" (dále jen „**Dílo**").

2. S ohledem na skutečnost, že stavební povolení vydané Městským úřadem v Příbrami, stavební úřad a územní plánování, Speciální stavební úřad pro dopravní stavby, se sídlem Tyršova 108, Příbram, PSČ 261 19, sp. zn. SZ MeÚPB22235/2015, č. j. MeÚPB 22235/2015 SÚÚP/Kleč (dále jen „stavební povolení"), nabyla Smlouva tímto dnem (tj. 23.06.2015) ve smyslu čl. XVII. odst. 1 Smlouvy účinnosti.

3. Objednatel ani zhotovitel ve smyslu čl. XVII. odst. 2 až odst. 4 nevyužili svého práva na odstoupení od Smlouvy.

4. Během realizace Díla byl v místě staveniště zjištěn výskyt zvláště chráněného živočicha – Mihule potoční (Lampetra Planeri), který způsobil nutnost přerušení stavebních prací na Díle a vyžádal si udělení výjimky dle § 56 odst. 2 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., ze zákazů podle § 50 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. a vydání souhlasného závazného stanoviska ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje ve smyslu § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., k zásahu do významného krajinného prvku – vodní tok a údolní niva, v evropsky významné lokalitě Obecnický potok.

5. S ohledem na výše uvedené proto smluvní strany dne 25.09.2015 uzavřeli dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým prodloužili termín dokončení stavebních prací dle čl. VII. odst. 3, z 30.09.2015 do 15.11.2015.

6. Výjimka a souhlasné závazné stanovisko bylo Krajským úřadem Středočeského kraje vydáno na základě žádosti zhotovitele až dne 02.11.2015, pod sp. zn. SZ – 133758/2015/KÚSK/4, č. j. 145446/2015/KÚSK (dále jen „rozhodnutí KÚSK").

7. Zhotovitel a objednatel, vzhledem k výše uvedenému, se proto na základě vzájemného konsenzu s ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále s ohledem na to, že provádění části Díla připadne na zimní období a z důvodu technologické přestávky, a prodloužení termínů plnění částí Díla je tak nezbytné, neboť nastala objektivní nemožnost jejich realizace, když Smluvní strany mají zájem na přiměřeném posunutí termínů plnění částí Díla po dobu nezbytně nutnou a zároveň změnu Harmonogramu provádění Díla, který je přílohou č. 3 Smlouvy, dohodli ve smyslu čl. VII. odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 věta čtvrtá a věta pátá Smlouvy, že termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se z termínu 30.09.2015 dle čl. VII. odst. 3 Smlouvy, ve smyslu dodatku č. 1 ke Smlouvě prodlouženého do 15.11.2015, prodlužuje do 30.4.2016.

8. Smluvní strany se proto dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. VII. odst. 3 Smlouvy nově zní takto:
„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 30.4.2016. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté doby."

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy:
č. 1 – Harmonogram provádění díla

V Říčanech dne 10.11.2015

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00050001 DIČ: CZ00050001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne 10.11.2015

Zhotovitel:

Metrostav, a.s.
Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	**Obecnice most 1185-5**	**264,82 dny**	**10.8. 15**	**30.4. 16**	
2	**SO201 Obecnice most 1185-5**	**112,18 dny**	**10.8. 15**	**30.11. 15**	
74					
75	**SO301 Přeložka vodovodu**	**96,73 dny**	**15.8. 15**	**19.11. 15**	
78					
79	**Kompletace dokumentace a závěrečné zprávy**	**153 dny**	**30.11. 15**	**30.4. 16**	
80	Doložení zkoušek a kompletace dokladové části závěrečné zprávy	153 dny	30.11. 15	30.4. 16	

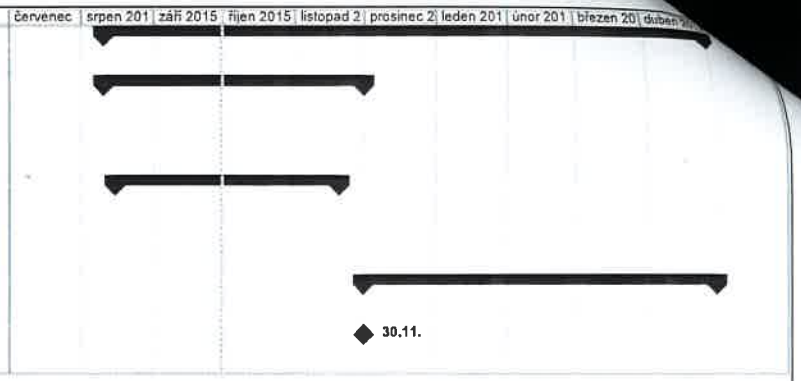

Projekt: HMG
Datum: 30.9. 15

Úkol		Milník		Zahrnutý kritický úkol		Rozdělení		Seskupit podle souhrnu	
Kritický úkol		Souhrnný		Zahrnutý milník		Vnější úkoly		Konečný termín	
Průběh		Zahrnutý úkol		Zahrnutý průběh		Souhrn projektu			
