

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

„SILNICE II/441: křiž. R35 – hr. Kraje Moravskoslezského část POTŠTÁT“
příloha Přechody pro chodce

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Město Potštát
Zámecká 1, 753 62 Potštát
Zastoupena:
René Passingerem, starostou obce
IČ : 00301795
DIČ: CZ 00301795
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Hranice
číslo účtu: 1883128319/0800
Tel: 602 528 883

a

Společnost dodavatelů „COLAS + SWIETELSKY – II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského“

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
kontaktní adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava
Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
Telefon: 596 632 264 e-mail: vychod@colas.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
COLAS CZ, a.s., oblast Východ, Sládkova 14, 702 00 Ostrava
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Éric Biguet, předseda představenstva,
Ing. Tomáš Kroner, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
Ing. Jaroslav Maršík, č. aut. 1003497

Zhotovitel 2: SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

kontaktní adresa: **Jahodová ulice 60, 620 00 Brno**

Zápis v **OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

IČO: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jakub Hříva, ředitel oblasti Olomouc

Ing. Vlastimil Peštál, vedoucí zakázek oblasti Olomouc

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

- SO 116 – Přejchody pro chodce – Potštát
- SO 401 – Osvětlení přechodů pro chodce - Potštát

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení „SILNICE II/441: křiž. R35 – hr. Kraje Moravskoslezského část POTŠTÁT“ příloha Přejchody pro chodce od projekční kanceláře ViaDesign s.r.o., Na Zahradkách 16, 690 02 Břeclav, číslo zakázky VD 03715, datum VIII/2015 a nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě soupisu prací (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplaty zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. Smluvní strany jsou povinny postupovat v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná od projekční kanceláře ViaDesign s.r.o., Na Zahrádkách 16, 690 02 Břeclav, číslo zakázky VD 03715, datum VIII/2015, akce „SILNICE II/441: křiž. R35 – hr. Kraje Moravskoslezského část POTŠTÁT“, příloha Přechody pro chodce (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 22.8.2017, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	325 481,52 Kč
DPH 21%	68 351,12 Kč
Celková cena díla vč. DPH	393 832,63 Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle rozpočtového ceníku jednotlivých PD v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Smluvní strany jsou povinny postupovat v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
 - a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

- b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1. Předání staveniště: 1.3.2018
2. Termín pro zahájení stavebních prací je totožný s termínem pro předání staveniště.
3. Lhůta pro provedení díla: **150 kalendářních dnů od předání staveniště**
4. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
5. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací.
6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dnů od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamací uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamací neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává.
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamacie u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamacie.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo až do výše 90% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. To znamená, že dílčí faktury budou uhrazeny objednatelem v plné výši až do celkového součtu těchto faktur 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření
 - předmět díla
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.
7. Zhotovitel je povinen každou fakturu označit číslem projektu.

8. V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury, pak zaplatí zhotoviteli úrok prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.
4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.
5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle

ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
 - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - odpovídajících pracovních podmínek
 - opatření k požární ochraněstanovených příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
5. Dodací podmínky:
 - stavební práce budou probíhat za **úplné i částečné** uzavírky. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
 - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
 - živičná úprava nebude přesahovat stávající nebezpečnou krajnici,
 - veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
 - zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
 - zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele,
 - od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
 - při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
 - zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP).
 - doklad o nakládání s odpady
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Bankovní záruky

1. Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla, která bude:
 - ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH;
 - platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení stavebního díla), a to do okamžiku dokončení díla dle čl. 4. této smlouvy.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 20 dnů od uzavření této smlouvy.
4. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku nepředloží dle tohoto článku, pak má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši odpovídající 1/4 částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
5. Originál listiny o bankovní záruce bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení její platnosti.

12. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2028:
 - a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
 - b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
 - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
 - d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
 - e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
3. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky z dotace, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
4. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z dotace, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.


5. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
7. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
10. Na ~~28.~~ zasedání Zastupitelstva města Potštát konaného dne ~~27.9.~~ 2017 v MěÚ od ~~17:00~~ hod. byla schválena smlouva o dílo pod bodem ~~12/28.Z/2017~~ pod názvem „Silnice II/441: křiž. R 35-hr. kraje Moravskoslezského, část Potštát“.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet
 č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Potštátě dne 2.10.2017
Za objednatele:




Město Potštát
René Passinger
Starosta

 Město Potštát
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ00177008 (19)
Tel.: 266 003 511; Fax: 266 003 141


V Praze dne 13.9.2017
Za zhotovitele, vedoucí společnosti:

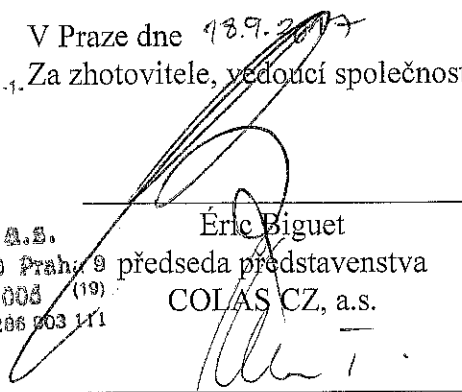

Eric Biguet
předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.


Ing. Tomáš Krones
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

V Olomouci dne 2. října 2017
Za zhotovitele, člen společnosti:



Ing. Jakub Hřiva
ředitel oblasti Olomouc
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

 SWIETELSKY
stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
Právní územní působnost: OZ DS MORAVA
Sídlo: 789 01 Brno, Jirákových nám. 60
IČ: 266 003 511, Fax: 266 003 141



Ing. Vlastimil Peštál
Vedoucí zakázek oblasti Olomouc
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

Souhrnný rozpočet

Měna: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Soubor staveb: 17131060 - II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského			
Stavba: VD03715 - Silnice II/441: křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, Město Potštát			
Objekt: SO 116 - Přechody pro chodce - Potštát	177 213,94	37 214,93	214 428,87
Objekt: SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce	148 267,57	31 136,19	179 403,76
CELKEM Stavba: VD03715 - Silnice II/441: křiž. R35 - hr. kraje M	325 481,52	68 351,12	393 832,63



Město Potštát
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT



SWIETELSKY

Stavba, s.r.o.
203002 0101 Pevnostní ulice / Morava
27 - 030 00 Brno - Janáčkova 66
IČ: 252 03 000

COLAS CZ, a.s.

Kašlíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177003 (19)
Tel.: 286 003 511, Fax: 286 003 111

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Soubor staveb: 17131060 - II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského

Stavba: VD03715 - Sílnice II/441: křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, Město Potštát

Objekt: SO 116 - Přechody pro chodce - Potštát

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,640000 t	168,30	276,01	21%	333,97
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	9,070000 t	168,30	1 526,48	21%	1 847,04
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	19,860000 t	168,30	3 342,44	21%	4 044,35
004	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	33,380000 t	168,30	5 617,85	21%	6 797,60
023	kalkul	NÁKUP ORNICE	8,930000 m3	631,20	5 636,62	21%	6 820,31

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce **16 399,40** **19 843,28**

1 - Zemní práce

005	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	16,690000 m3	442,10	7 378,65	21%	8 928,17
006	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	148,720000 TKm	13,24	1 969,05	21%	2 382,55
007	113338	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	3,780000 m3	663,50	2 508,03	21%	3 034,72
008	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	36,290000 TKm	13,24	480,48	21%	581,38
009	11337A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - BEZ DOPRAVY	1,400000 m3	896,80	1 255,52	21%	1 519,18
009	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	89,300000 m2	26,20	2 339,66	21%	2 830,99
010	11337B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - DOPRAVA	73,920000 TKm	13,24	978,70	21%	1 184,23
010	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM	89,300000 m2	30,70	2 741,51	21%	3 317,23
011	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	0,650000 m3	1 649,50	1 072,18	21%	1 297,33
012	11348B	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA	5,730000 TKm	13,24	75,87	21%	91,80
013	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	74,900000 m	194,50	14 568,05	21%	17 627,34
014	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	368,510000 TKm	13,24	4 879,07	21%	5 903,68
023	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	9,840000 m3	526,00	5 175,84	21%	6 262,77
024	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	39,360000 m3km	27,00	1 062,72	21%	1 285,89
025	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	8,930000 m3	126,40	1 128,75	21%	1 365,79
026	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	186,420000 m2	15,85	2 954,76	21%	3 575,26

Součet za 1 - Zemní práce **50 568,83** **61 188,29**

5 - Komunikace

027	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	109,200000 m2	189,40	20 682,48	21%	25 025,80
028	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	91,200000 m2	278,50	25 399,20	21%	30 733,03



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

číslo:	Kč		Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
oř.	Kód	Popis					
29	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	18,200000 m2	557,70	10 150,14	21%	12 281,67
30	587205	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	12,300000 m2	221,30	2 721,99	21%	3 293,61
Součet za 5 - Komunikace					58 953,81		71 334,11
9 - Ostatní konstrukce a práce							
31	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	39,000000 m	265,20	10 342,80	21%	12 514,79
32	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	155,700000 m	263,00	40 949,10	21%	49 548,41
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					51 291,90		62 063,20
Celkem Objekt: SO 116 - Přečody pro chodce - Potštát					177 213,94		214 428,87
Objekt: SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce							
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	20,430000 t	168,30	3 438,37	21%	4 160,43
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	7,840000 t	168,30	1 319,47	21%	1 596,56
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					4 757,84		5 756,99
1 - Zemní práce							
003	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	23,190000 m3	1 004,50	23 294,36	21%	28 186,17
004	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	7,920000 m3	152,50	1 207,80	21%	1 461,44
005	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	8,470000 m3	578,50	4 899,90	21%	5 928,87
006	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	4,870000 m3	631,20	3 073,94	21%	3 719,47
Součet za 1 - Zemní práce					32 475,99		39 295,95
4 - Vodorovné konstrukce							
007	461313	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	1,760000 m3	2 997,70	5 275,95	21%	6 383,90
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					5 275,95		6 383,90
7 - Přidružená stavební výroba							
008	742F13	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	84,100000 m	194,50	16 357,45	21%	19 792,51
010	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	3,000000 KUS	15 252,10	45 756,30	21%	55 365,12
011	743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	1,000000 KUS	2 314,10	2 314,10	21%	2 800,06
012	743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M	3,000000 KUS	2 734,80	8 204,40	21%	9 927,32
014	743531	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W	4,000000 KUS	7 889,00	31 556,00	21%	38 182,76
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					104 188,25		126 067,78
8 - Potrubí							
016	87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO	20,000000 m	47,20	944,00	21%	1 142,24
017	899309	ĎŮPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	49,100000 m	12,74	625,53	21%	756,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
	Součet za 8 - Potrubí			1 569,53		1 899,14
Celkem	Objekt: SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce			148 267,57		179 403,76
CELKEM	Stavba: VD03715 - Silnice II/441: křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, Město Potštát			325 481,52		393 832,63



COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 8
DIČ: CZ226177003 (19)
Tel.: 206 003 511, Fax: 206 003 111

Text	8	3/2018			4/2018			5/2018			6/2018			7/2018			8/2018										
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1.3.2018																											
VD03715 - Silnice II/441: kříž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, 28.7.2018																											
1.3.2018																											
SO 116 - Přechody pro chodce - Potštát 28.7.2018																											
1.3.2018																											
SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce 28.7.2018																											

POŠTĚLSKY
 s.r.o.
 Světlá nad Sázavou, ul. J. A. Komenského 100
 280 02 Světlá nad Sázavou, tel: 311 620 111
Město Potštát - DIČ: CZ26177005 (19)
 Zámecká čp. 1
 753 62 POTŠTÁT

Měna: Kč

Organizační jednotka: 13112 - HSV Cmel Petr

1.3.2018 - 28.7.2018

Soubor staveb: 17131060 - II/441 kříž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského
Stavba: VD03715 - Silnice II/441: kříž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, Město Potštát

		Rok 2018												
		Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec		
	0,00	67 266,18	65 096,30	67 266,18	67 266,18	65 096,30	60 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 481,52	0,00
Obýt	0,00	67 266,18	65 096,30	67 266,18	67 266,18	65 096,30	60 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 481,52	0,00

Objekt: SO 116 - Přechody pro chodce - Potštát

		Rok 2018												
		Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec		
	0,00	36 624,22	35 442,79	36 624,22	36 624,22	35 442,79	33 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 213,94	0,00
Obýt	0,00	36 624,22	35 442,79	36 624,22	36 624,22	35 442,79	33 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 213,94	0,00

Objekt: SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce

		Rok 2018												
		Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec		
	0,00	30 641,96	29 653,51	30 641,96	30 641,96	29 653,51	27 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 267,57	0,00
Obýt	0,00	30 641,96	29 653,51	30 641,96	30 641,96	29 653,51	27 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 267,57	0,00

325 481,52

CELKEM Stavba: VD03715 - Silnice II/441: kříž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, Město Potštát

Město Potštát
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT

SWEETELSKY
AREBNI S.R.O.
Svatoplukova 60
602 00 Brno - Jihlava 60

⑥

COLAS CZ, a.s.
Ke Mlýnskému 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177905 (19)
Tel.: 286 003 511, Fax: 286 003 111
